

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PM

BÀI THỰC HÀNH TUẦN 6

GIỚI THIỆU NỘI DUNG THỰC HÀNH



NỘI DUNG

1. Cân bằng tài nguyên dự án
2. Tạo các báo cáo trong dự án
3. Xử lý sự cố
4. Bài tập thực hành và Hỏi đáp

NỘI DUNG THỰC HÀNH TUẦN 6

1



CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Mục tiêu

- Nắm các phương pháp cân bằng tài nguyên cho dự án.
- Cân bằng tài nguyên tự động và cân bằng tài nguyên thủ công.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN


Giới thiệu

- Có 2 cách cân bằng tài nguyên trong dự án:
 - **Cân bằng tự động:** dựa trên công cụ có sẵn trong MS Project.
 - **Cân bằng thủ công:**
 - Xác định tài nguyên bị quá tải.
 - Lọc lại công việc có tài nguyên bị quá tải.
- **Sau khi chọn các tài nguyên bị quá tải thì sẽ thực hiện một trong các cách sau:**
 - Chuyển công việc song song thành tuần tự.
 - Tăng độ trễ giữa 2 công việc.
 - Phân chia công việc thành nhiều phần.
 - Bổ sung thêm tài nguyên cho công việc.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng tự động

- Sử dụng công cụ **Resource Leveling** trong MS Project
 - Vào **Resource** → **Leveling Options**

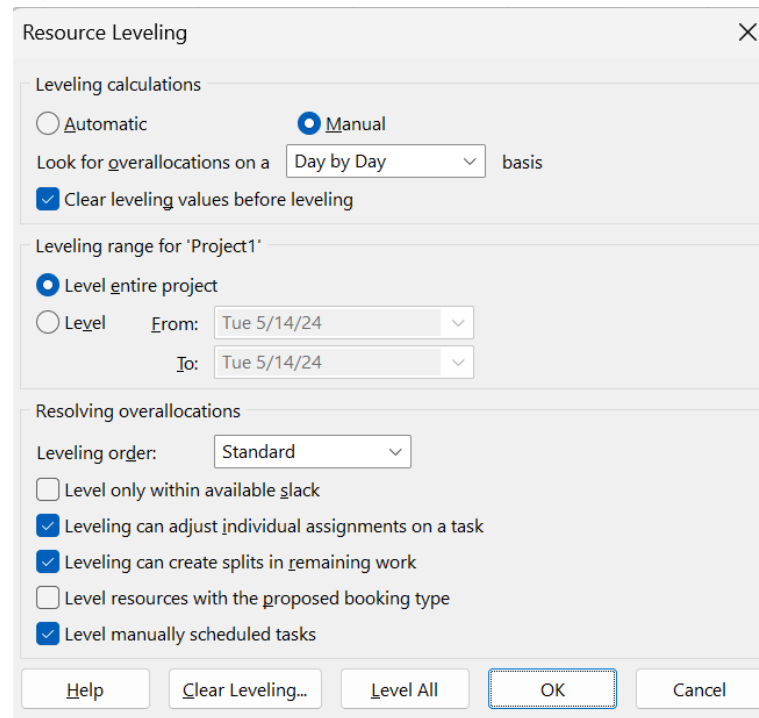

Hình 1. Chức năng cân bằng tài nguyên

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng tự động

- **Automatic:** tự động cân bằng tài nguyên trong quá trình gán tài nguyên cho công việc.
- Có 2 cách cân bằng:
 - Cân bằng cho toàn bộ dự án.
 - Cân bằng trong khoảng thời gian xác định.
 - Sau khi lựa chọn phương pháp cân bằng thì chọn OK để thực hiện cân bằng tự động.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng thủ công

- Xác định tài nguyên quá tải.
 - Vào View → Resource Sheet, tài nguyên nào bị tô đỏ chính là tài nguyên quá tải.


	Carole Poland	Work		C
	Color Setting Service	Work		C
	Copyeditors	Work		C
	Dan Jump	Work		D
	Hany Morcos	Work		H
	Jane Dow	Work		J
	Jun Cao	Work		J
	Luis Sousa	Work		L
	Printing Service	Work		P
	Tad Orman	Work		T
	Travel	Cost		T
	Advance proofs	Material	copies	AP

Hình 2. Xem các tài nguyên bị quá tải

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng thủ công

- Xác định tài nguyên quá tải.
 - Vào View → Resource Views → Other Views → Resource Graph để xem biểu đồ tài nguyên bị quá tải.

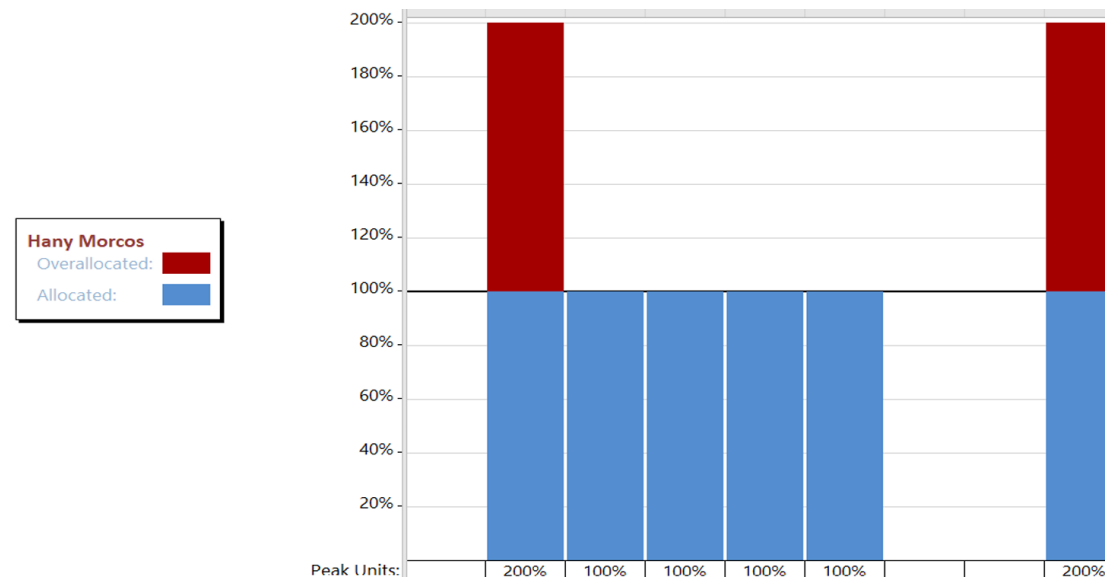

Hình 3. Xem biểu đồ tài nguyên quá tải

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng thủ công

- Lọc công việc có sử dụng tài nguyên quá tải
 - Vào **View** → **Filter** → **Using Resources** → Chọn tên tài nguyên bị quá tải → OK



Hình 4. Lọc công việc có tài nguyên bị quá tải

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng thủ công

- Các phương pháp cân đối.

- **Chuyển công việc từ song song thành tuần tự**

Nhằm giảm tải cho nhân lực phải thực hiện nhiều công việc cùng một lúc.

Phương pháp này có thể gây ra những hiệu ứng sau:

- Thích hợp với những công việc không nằm trên đường găng của dự án.
- Thường kéo dài thời gian thực hiện dự án.
- Chi phí không thay đổi, thời gian thực hiện dự án tăng lên.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng thủ công

- Các phương pháp cân đối.

- **Tăng độ trễ giữa 2 công việc**

Khi áp dụng biện pháp này sẽ giúp giảm thời gian gối chồng giữa các công việc để giảm thời gian tài nguyên bị quá tải.

- **Phân chia công việc thành nhiều phần (Split Task)**

Chia nhỏ công việc thành từ hai thành phần theo khoảng thời gian phù hợp.

Lưu ý đối với phương pháp này:

- ✓ Phân chia các công việc thành các phần nhỏ để tránh gối chồng lên nhau.
- ✓ Thích hợp để phân bổ các công việc ngắn trên đường găng, chèn vào các công việc kéo dài có độ thả nổi.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Cân bằng thủ công

- Các phương pháp cân đối.

➤ Bổ sung tài nguyên

Dùng phương pháp này khi không sử dụng được các phương pháp trên. Tăng chi phí cho dự án, không tăng thời gian thực hiện.

Task Information

General | Predecessors | Resources | Advanced | Notes | Custom Fields

Name: Interior illustration design Duration: 15 days ☐ Estimated

Resources:

Resource Name	Assignment Owner	Units	Cost
Luis Sousa		100%	\$8,400.00
Hany Morcos		100%	\$4,650.00

Help OK Cancel

Hình 5. Bổ sung tài nguyên cho dự án

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file **FineTunePlan** để làm bài thực hành

- **Kiểm tra tình trạng tài nguyên bị quá tải**

Cho tình huống sau: Tại Nhà xuất bản Lucerne, kế hoạch ra mắt sách mới cho trẻ em đã được thực hiện, đến thời điểm bạn cần kiểm tra sự phân công tài nguyên và các tài nguyên quá tải. Ta sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng công việc của nhân viên Carole Poland.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file FineTunePlan để làm bài thực hành

- Kiểm tra tình trạng tài nguyên bị quá tải

Sau khi kiểm tra thì thấy rằng **Carole Poland** có tình trạng quá tải vào ngày thứ 2, 24/4/2023.

		Resource Name	Work	Add New Column
1		Carole Poland	213 hrs	
		Handoff to Editorial	0 hrs	
		Copyedit incorp	40 hrs	
		Content edit	120 hrs	
		Final review	12 hrs	
		Editorial staff meeting 1	1 hr	
		Editorial staff meeting 2	1 hr	
		Editorial staff meeting 3	1 hr	
		Editorial staff meeting 4	1 hr	
		Editorial staff meeting 5	1 hr	
		Editorial staff meeting 6	1 hr	
		Editorial staff meeting 7	1 hr	
		Editorial staff meeting 8	1 hr	
		Editorial staff meeting 9	1 hr	
		Editorial staff meeting 10	1 hr	
		Editorial staff meeting 11	1 hr	
		Editorial staff meeting 12	1 hr	
		Editorial staff meeting 13	1 hr	
		Launch planning	20 hrs	
		Assign launch team members	8 hrs	

Hình 6. Kiểm tra tình trạng quá tải của nhân viên Carole Poland

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file **FineTunePlan** để làm bài thực hành

- **Cân bằng tài nguyên cách thủ công**

Cho tình huống sau: Chúng ta thấy nhiều tài nguyên quá tải trong kế hoạch. Không giống trường hợp của Carole Poland chúng ta đã kiểm tra trước đó, các vị trí quá tải nghiêm trọng hơn của Hany Morcos và phải yêu cầu cân bằng cho tài nguyên này.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file **FineTunePlan** để làm bài thực hành

▪ Cân bằng tài nguyên cách thủ công

Tiếp tục sử dụng file **FineTunePlan**, hãy thực hiện các bước sau:

- Trong dạng xem Resource Usage, xác định vị trí quá tải của Hany Morcos vào tuần cuối của tháng 8.
- Chỉnh sửa công việc Proof and Review từ 8 giờ xuống thành 4 giờ vào các ngày 25, 28, 29 tháng 8.
- Tiếp tục chỉnh sửa nhiệm vụ Create mockup từ 8 giờ xuống thành 4 giờ vào các ngày 25, 28, 29 tháng 8.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file FineTunePlan để làm bài thực hành

■ Cân bằng tài nguyên cách thủ công

Resource Name			Work	Add New Column	Aug 20, '23							Aug 27, '23							
					F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F
5		Hany Morcos	369 hrs									8h			8h	8h	8h	8h	4h
		Handoff to Production	0 hrs																
		Incorporate 1st Pages review	40 hrs																
		Send proofed pages to Production	0 hrs																
		Proof and review	28 hrs																
		Send proofed pages to Production	0 hrs																
		Send to color house	8 hrs																
		Organize manuscript for copyedit	40 hrs																
		Final review	20 hrs																
		Editorial staff meeting 1	1 hr																
		Editorial staff meeting 2	1 hr																
		Editorial staff meeting 3	1 hr																
		Editorial staff meeting 4	1 hr																
		Editorial staff meeting 5	1 hr																
		Editorial staff meeting 6	1 hr																
		Editorial staff meeting 7	1 hr																
		Editorial staff meeting 8	1 hr																
		Editorial staff meeting 9	1 hr																
		Editorial staff meeting 10	1 hr																
		Editorial staff meeting 11	1 hr																
		Editorial staff meeting 12	1 hr																
		Editorial staff meeting 13	1 hr																
		Create mockup	12 hrs																
		Interior illustration design	120 hrs																
		Complete author questionnaire	40 hrs																
		Schedule author interviews	8 hrs																
		Design and order marketing materials	40 hrs																

Details	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F
Work								8h			8h	8h	8h	8h	4h
Work															
Work															
Work															
Work								4h			4h	4h	8h	8h	
Work														0h	
Work															
Work															4h
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															
Work															

Hình 7. Cân bằng công việc cho Hany Morcos

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file **FineTunePlan** để làm bài thực hành

- **Cân bằng tài nguyên tự động**


Vào group **Resource** → **Leveling Option** → Trong hộp thoại **Resource Leveling** ta chọn vào ô **Automatic** → **Level All** cho toàn bộ dự án.

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Ví dụ thực hành trên Microsoft Project

Sinh viên sử dụng file **FineTunePlan** để làm bài thực hành

- **Cân bằng tài nguyên tự động**

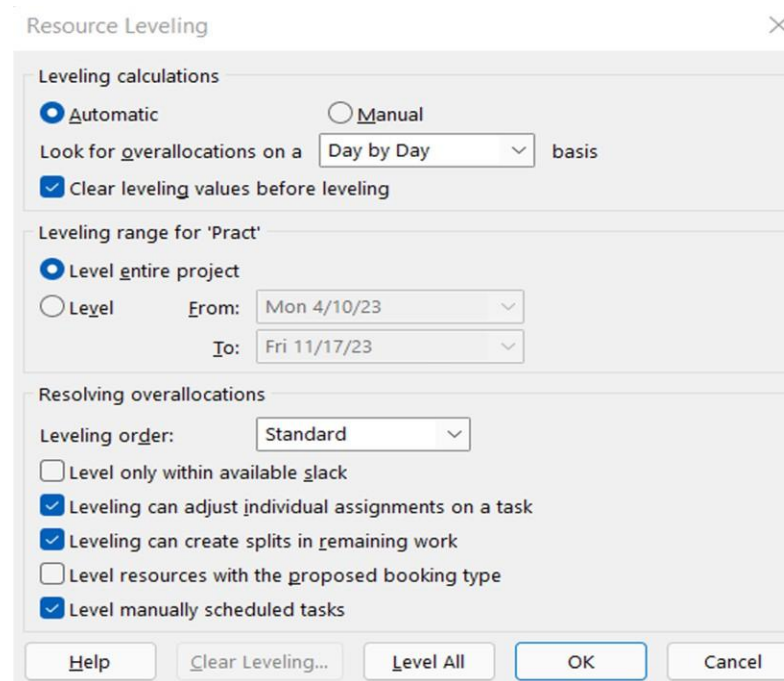

The screenshot shows the 'Resource Leveling' dialog box in Microsoft Project. The 'Leveling calculations' section has 'Automatic' selected. The 'Look for overallocations on a' dropdown is set to 'Day by Day'. The 'Clear leveling values before leveling' checkbox is checked. The 'Leveling range for 'Pract'' section has 'Level entire project' selected. The 'Resolving overallocations' section has 'Leveling order' set to 'Standard'. The 'Level only within available slack' checkbox is unchecked. The 'Leveling can adjust individual assignments on a task' checkbox is checked. The 'Leveling can create splits in remaining work' checkbox is checked. The 'Level resources with the proposed booking type' checkbox is unchecked. The 'Level manually scheduled tasks' checkbox is checked. The 'OK' button is highlighted.

Hình 8. Cân bằng tài nguyên tự động trong dự án

NỘI DUNG THỰC HÀNH TUẦN 6

2



TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Mục tiêu

- Tìm hiểu các công cụ thực hiện báo cáo trong MS Project.
- Thực hiện việc tạo báo cáo và xuất báo cáo trong MS Project.

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Nội dung

- Trên công cụ MS Project, báo cáo là một công cụ để in dữ liệu, các báo cáo này được thiết kế để in ấn.
- Không thể nhập dữ liệu trực tiếp vào báo cáo.

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Nội dung

- **Có các loại chức năng sau trong công cụ Report của MS Project:**
 - ***DashbOard***: Thể hiện tổng quan về chi phí, công việc, dự án, nhiệm vụ sắp tới.
 - ***ResOurces***: Báo cáo về tài nguyên (chủ yếu là nguồn nhân lực) bao gồm: các nguồn tài nguyên bị quá tải và tổng quan về tài nguyên của dự án.
 - ***COsts***: báo cáo về chi phí bao gồm: dòng chi phí, chi phí vượt quá, báo cáo giá trị thu được, tổng quan về chi phí của dự án, tổng quan về chi phí của từng công việc trong dự án.
 - ***lfi PrOgress***: báo cáo tiến trình bao gồm: các nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ trễ hạn, báo cáo các cột mốc, các nhiệm vụ chia nhỏ.
 - ***CustOm***: báo cáo do người dùng tùy chỉnh.

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Hiện thị báo cáo tổng quan về chi phí của dự án
- Vào Report → Cost Overview

COST OVERVIEW

MON 1/9/23 - TUE 2/28/23



COST STATUS

Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Planning Phase	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
Internal Launch Phase	\$13,942.00	\$0.00	\$0.00	\$13,942.00	\$13,942.00
Public Launch Phase	\$0.00	\$13,352.00	\$0.00	\$13,352.00	\$13,352.00

PROGRESS VERSUS COST


Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost line, your project may be over budget.



COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?

[Try setting as baseline](#)

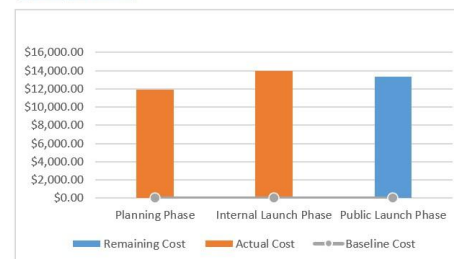

Hình 9. Báo cáo tổng quan về chi phí

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN


Ví dụ

- **Hiển thị báo cáo tổng quan về chi phí của dự án**
- Vào Report → Task Cost Overview để xem chi phí cho từng nhiệm vụ trong dự án.

TASK COST OVERVIEW


COST STATUS

Cost status for top-level tasks.

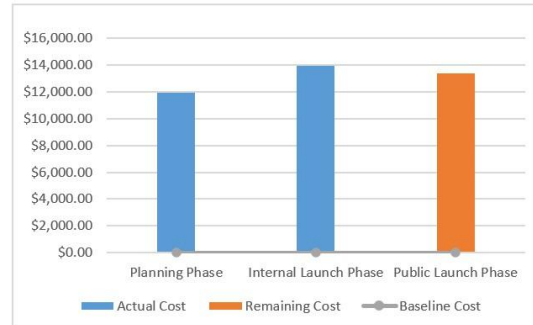

COST DISTRIBUTION

How costs are spread out amongst tasks based on their status.

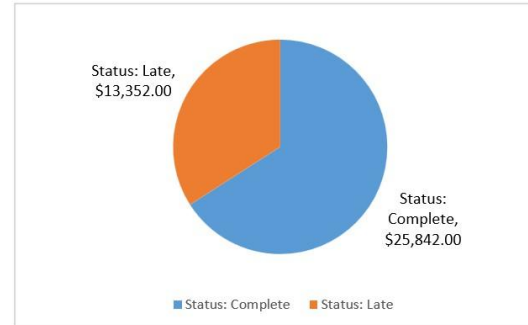

COST DETAILS

Cost details for all top-level tasks.

Name	Fixed Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Planning Phase	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
Internal Launch Phase	\$0.00	\$13,942.00	\$0.00	\$13,942.00	\$0.00	\$13,942.00
Public Launch Phase	\$0.00	\$0.00	\$13,352.00	\$13,352.00	\$0.00	\$13,352.00

Hình 10. Báo cáo chi phí của từng công việc trong dự án

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Báo cáo tổng quan của dự án
- Vào Report → Project Overview

PROJECT OVERVIEW

MON 1/9/23 - TUE 2/28/23

% COMPLETE

66%


MILESTONES DUE

Milestones that are coming soon.

Name	Finish
Launch complete!	Tue 2/28/23

% COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.

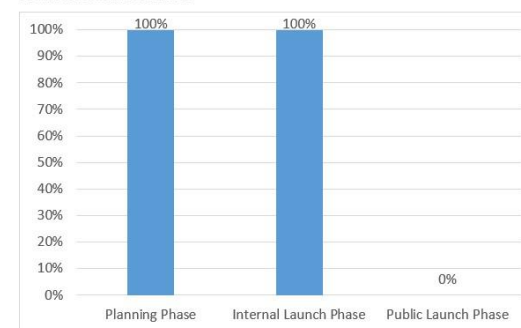

LATE TASKS

Tasks that are past due.


Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Resource Names
Author radio interview	Mon 2/13/23	Mon 2/13/23	1 day	0%	Toni Poe
Author reading and signing at book fair	Tue 2/14/23	Tue 2/14/23	1 day	0%	Toni Poe, Travel[\$800.00]
Distribute advance copies	Mon 2/13/23	Tue 2/14/23	2 days	0%	Vikas Jain, Toby Nixon

Hình 11. Báo cáo tổng quan dự án

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Báo cáo tổng quan về công việc
- Vào Report → Work Overview

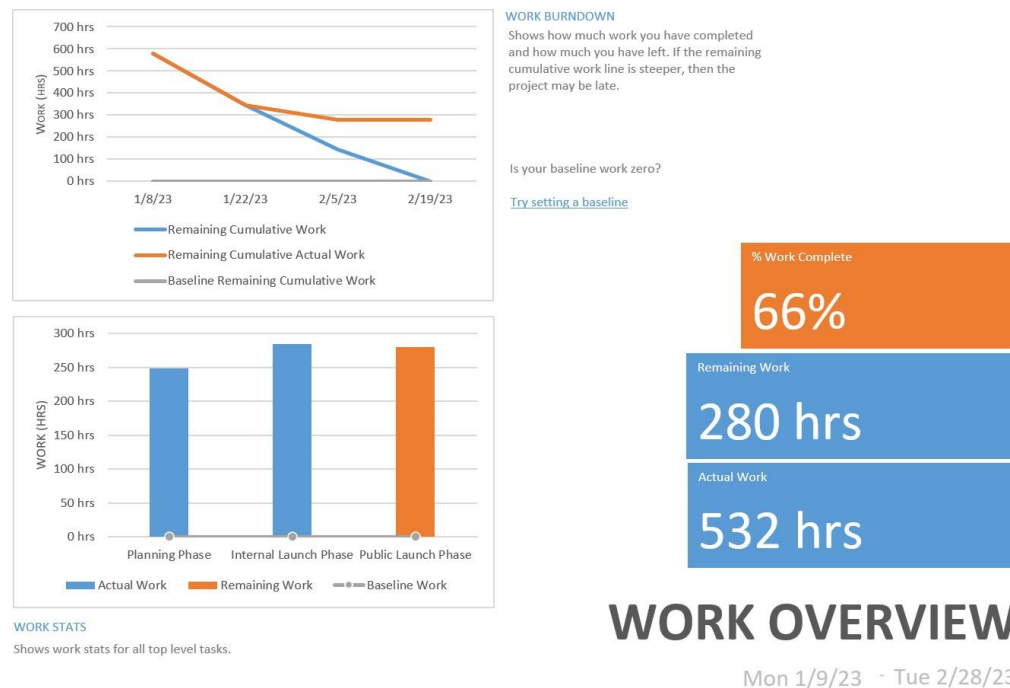

Hình 12. Báo cáo tổng quan về công việc trong dự án

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Báo cáo về tài nguyên
- Vào Report → Resource Overview

RESOURCE OVERVIEW




Hình 13. Báo cáo tổng quan về nguồn tài nguyên của dự án

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Báo cáo về dòng tiền
- Vào Report → Cost → Cash Flow

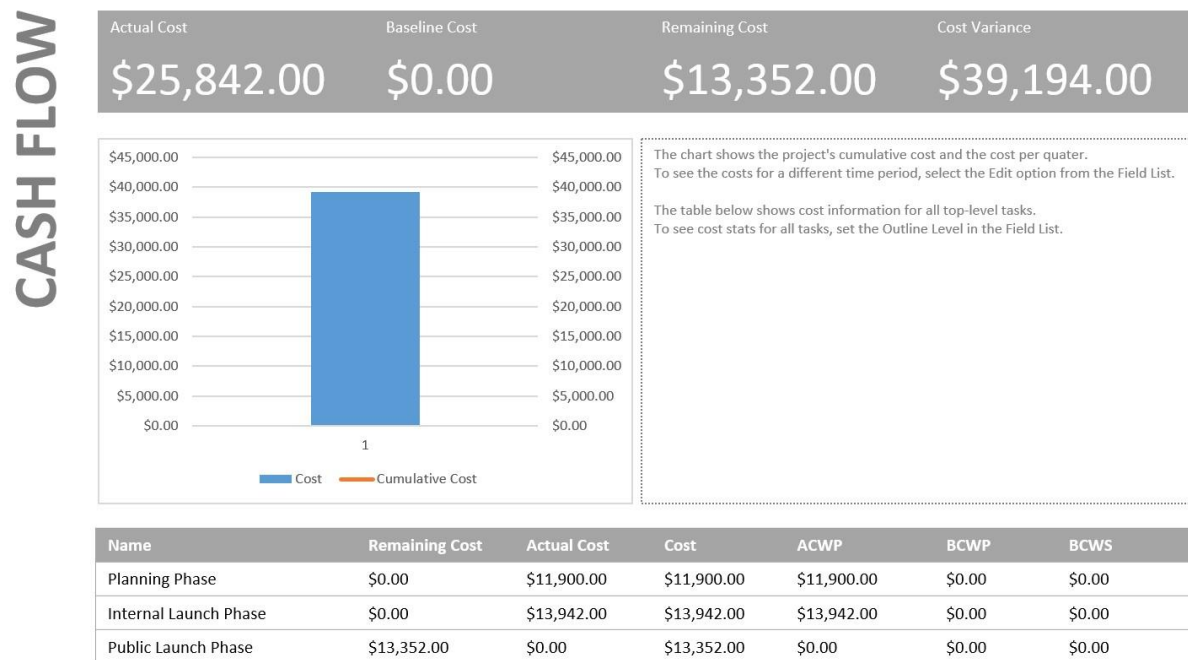

Hình 14. Báo cáo về các dòng tiền trong dự án.

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Báo cáo tiến trình công việc
- Vào Report → In Progress → Critical Task để xem báo cáo về các công việc nằm trên đường găng của dự án.

CRITICAL TASKS



■ Status: Complete ■ Status: Late

A task is critical if there is no room in the schedule for it to slip.

[Learn more about managing your project's critical path.](#)

Name	Start	Finish	% Complete	Remaining Work	Resource Names
Distribute book sales kit	Mon 2/13/23	Tue 2/14/23	0%	16 hrs	Zac Woodall
Launch public web portal for book	Wed 2/15/23	Tue 2/21/23	0%	80 hrs	Toby Nixon,Vikas Jain
Launch social media programs for book	Wed 2/22/23	Tue 2/28/23	0%	80 hrs	Toby Nixon,Vikas Jain
Launch complete!	Tue 2/28/23	Tue 2/28/23	0%	0 hrs	


Hình 16. Báo cáo về các công việc nằm trên đường găng

TẠO CÁC BÁO CÁO TRONG DỰ ÁN

Ví dụ

- Báo cáo tiến trình công việc
- Vào Report → In Progress → Late Task để xem báo cáo về các công việc trễ hạn của dự án.

LATE TASKS

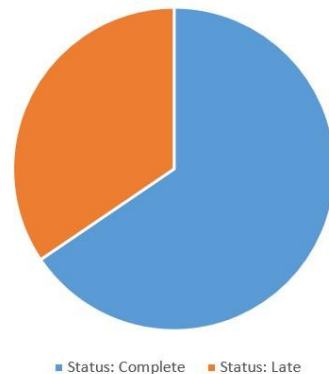

Tasks that are late as compared to the status date. A task is late if its finish date has passed or it is not progressing as planned.

Name	Start	Finish	% Complete	Remaining Work	Resource Names
Author radio interview	Mon 2/13/23	Mon 2/13/23	0%	8 hrs	Toni Poe
Author reading and signing at book fair	Tue 2/14/23	Tue 2/14/23	0%	8 hrs	Toni Poe,Travel[\$800.00]
Distribute advance copies	Mon 2/13/23	Tue 2/14/23	0%	32 hrs	Vikas Jain,Toby Nixon
Distribute book sales kit	Mon 2/13/23	Tue 2/14/23	0%	16 hrs	Zac Woodall
Coordinate magazine feature articles	Wed 2/15/23	Thu 2/23/23	0%	56 hrs	Zac Woodall
Launch public web portal for book	Wed 2/15/23	Tue 2/21/23	0%	80 hrs	Toby Nixon,Vikas Jain
Launch social media programs for book	Wed 2/22/23	Tue 2/28/23	0%	80 hrs	Toby Nixon,Vikas Jain
Launch complete!	Tue 2/28/23	Tue 2/28/23	0%	0 hrs	

Hình 17. Báo cáo về các công việc trễ hạn của dự án

NỘI DUNG THỰC HÀNH TUẦN 6

3



XỬ LÝ SỰ CỐ

XỬ LÝ SỰ CỐ

Giới thiệu 1 số loại rủi ro

- Các rủi ro trong dự án bạn nêu bao gồm nhiều loại và ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của dự án. Dưới đây là một số phân loại rủi ro:
 - Rủi ro về lịch trình (Schedule)
 - Rủi ro từ yêu cầu nghiệp vụ
 - Rủi ro về sản phẩm và công nghệ
 - Rủi ro trong quản lý dự án
 - Rủi ro từ phía khách hàng
 - Rủi ro từ nhân sự tham gia dự án
 - Rủi ro tài chính

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro về lịch trình (Schedule)
 - Lịch trình không thực tế, dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thành các công việc.
 - Quên không bao gồm các nhiệm vụ quan trọng trong lịch trình.
 - Sự chậm trễ của một nhiệm vụ có thể làm trễ hạn các nhiệm vụ phụ thuộc khác.
 - Công việc không quen thuộc mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến để hoàn thành.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro từ yêu cầu nghiệp vụ
 - Quy trình nghiệp vụ có thể thay đổi trong suốt quá trình triển khai dự án.
 - Phạm vi và yêu cầu của dự án tăng, có thể vượt quá ngân sách dự kiến.
 - Hệ thống phát triển không đáp ứng được nhu cầu của người dùng.
 - Yêu cầu đặc biệt không được dự án hỗ trợ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro về sản phẩm và công nghệ
 - Thiết kế giao diện người dùng không đúng, cần phải thiết kế lại.
 - Phát triển chức năng không theo kế hoạch ban đầu.
 - Tích hợp với các sản phẩm khác không được chuẩn bị kỹ lưỡng.
 - Sự thay đổi trong phiên bản phần cứng hoặc phần mềm trong quá trình dự án.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro trong quản lý dự án
 - Thay đổi thường xuyên về ưu tiên các hạng mục.
 - Điều kiện thành công của dự án không rõ ràng.
 - Sử dụng chung nhân sự và tài nguyên cho nhiều dự án.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro từ phía khách hàng
 - Yêu cầu tính năng mới ngoài phạm vi dự án.
 - Khách hàng không sẵn sàng hợp tác hoàn toàn trong quá trình nghiệm thu và xác nhận.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro từ nhân sự tham gia dự án
 - Không đủ nhân sự chất lượng cao như yêu cầu.
 - Rủi ro nhân viên giỏi rời dự án do chênh lệch thu nhập.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ

- Rủi ro tài chính
 - Sai sót trong ước lượng kinh phí.
 - Người dùng không rõ ràng về yêu cầu, dẫn đến hiểu nhầm và tốn kém thêm.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ví dụ trình bày danh sách các rủi ro

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Độ ưu tiên (xs*td)
1. Lịch trình không thực tế	5	2	10
2. Nhiệm vụ quan trọng bị xót từ lịch trình	1	6	6
3. Một sự chậm trễ trong một nhiệm vụ gây ra sự chậm trễ các nhiệm vụ phụ thuộc trong dự án	6	2	12
4. Các công việc không quen thuộc của các sản phẩm mất nhiều thời gian hơn dự kiến để thiết kế và thực hiện	1	3	3
5. Quy trình nghiệp vụ có thể thay đổi trong khi triển khai dự án CNTT	7	5	35
6. Phạm vi và yêu cầu có thể tăng, dẫn đến thiếu kinh phí	6	7	42
7. Hệ thống có thể không đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của người dùng	9	5	45
8. Có những yêu cầu nghiệp vụ đặc biệt mà dự án không thể đáp ứng	2	3	6

XỬ LÝ SỰ CỐ

Bảng kế hoạch đối phó rủi ro, xử lý sự cố

BẢNG KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO SỐ 1			Ngày 15/05/2024
Độ ưu tiên 35		Tần suất 2.0	Mức tác hại 3.0
Rủi ro	Quy trình nghiệp vụ có thể thay đổi trong khi triển khai dự án công nghệ thông tin.		
Chiến lược	Giảm thiểu rủi ro		
Cách tiếp cận	1. Ban quản lý cấp cao phải tham gia vào quá trình xây dựng chính sách để đảm bảo hiểu rõ được tầm ảnh hưởng của bất kỳ thay đổi quan trọng nào. 2. Xây dựng các thay đổi cần thiết vào hệ thống thông qua quy trình quản lý thay đổi đã được phê duyệt.		
Trách nhiệm	Thành viên đảm nhận đảm bảo 1 và 2 thực hiện		
Người lập bảng	Ngày lập bảng	Người duyệt	Ngày duyệt
	Ký tên		Ký tên

NỘI DUNG THỰC HÀNH TUẦN 6

4



BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Thực hiện các yêu cầu sau

Yêu cầu: Tạo một kế hoạch trong MS Project bao gồm các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện dự án, các công việc trong dự án, các nguồn tài nguyên trong dự án.
- Kiểm tra sự quá tải của tài nguyên trong dự án (cân bằng tài nguyên nếu có)
- Kiểm tra các nguồn tài nguyên về chi phí.
- Xây dựng các baseline cho dự án.
- Kiểm tra lại các baseline và so sánh với kế hoạch ban đầu của dự án. Đánh giá tiến độ của dự án (chậm tiến độ, sớm tiến độ, đúng tiến độ).
- Yêu cầu trình bày chi tiết, từng bước có hình ảnh minh họa

Giả sử các công việc trong dự án đã hoàn thành và dự án đã kết thúc, hãy thực hiện các báo cáo tài chính cho dự án.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 2: Thực hiện các yêu cầu sau

Yêu cầu: Thực hành tạo các báo cáo trong công cụ Microsoft Project.

- Tìm hiểu các mẫu Report trong công cụ MS Project.
- In Report trên Công cụ MS Project.
- Trình bày chi tiết từng bước có hình ảnh minh họa
- Tổng hợp thành file word bài tập hoàn thiện, có từng bước thực hiện.

